

Ersatz Staumauer Spitallamm: zweite Bausaison abgeschlossen

Nach intensiven Monaten auf der Baustelle ist die zweite Bausaison an der Grimsel seit Mitte November offiziell zu Ende, und es herrscht Winterpause. Die Saison ist erfolgreich verlaufen, und die Arbeiten sind auf Kurs. Einige Impressionen von der Baustelle in der Fotostrecke.

von **Nora Devenish**

Die Bausaison 2020 ist erfolgreich verlaufen, und alle innerhalb dieser zweiten Bauphase geplanten Arbeiten konnten termingerecht abgeschlossen werden. Zentrale Elemente waren das Fertigstellen des Fundamentaushubs links und rechts der bestehenden

Spitallamm Mauer sowie im Talboden unmittelbar vor der Mauer, weiter das Bohren eines 90 Meter tiefen Liftschachtes, der Ausbruch des Zugangstollens zur neuen Apparatekammer und der Aufbau und die Inbetriebnahme des Betonwerks beziehungsweise des Kieswerks an der Gerstenegg und die ersten Betonversuche. Für die dritte Bausaison im 2021 steht

die Installation der zwei rund 100 Meter hohen Baukrane an, es wird weitergehen mit dem Abschluss der Betonversuche, und schliesslich werden die Betonierarbeiten für die Staumauer starten. Geplante Wiederaufnahme der Bauarbeiten ist Mai 2021.


VIDEO
www.jungfrauzeitung.ch/artikel/186559
 Nr. 186559, online seit: 4. Dezember – 07.00 Uhr



Kraftwerke Oberhasli AG
 Grimselstrasse 19
 3862 Innertkirchen
www.grimselstrom.ch

1 1
 Für den Fundamentaushub mussten wir direkt vor der alten Mauer sprengen und abtragen – notabene mit vollem Grimselsee unmittelbar dahinter. Da durfte nichts passieren. Vorgängig haben wir darum umfangreiche Risikoabklärungen und Berechnungen durchgeführt. Ich bin sehr froh, dass sich die Prognosen bestätigt haben und keine Überraschungen aufgetreten sind

Benno Schwiegler, Leiter Projekte KWO

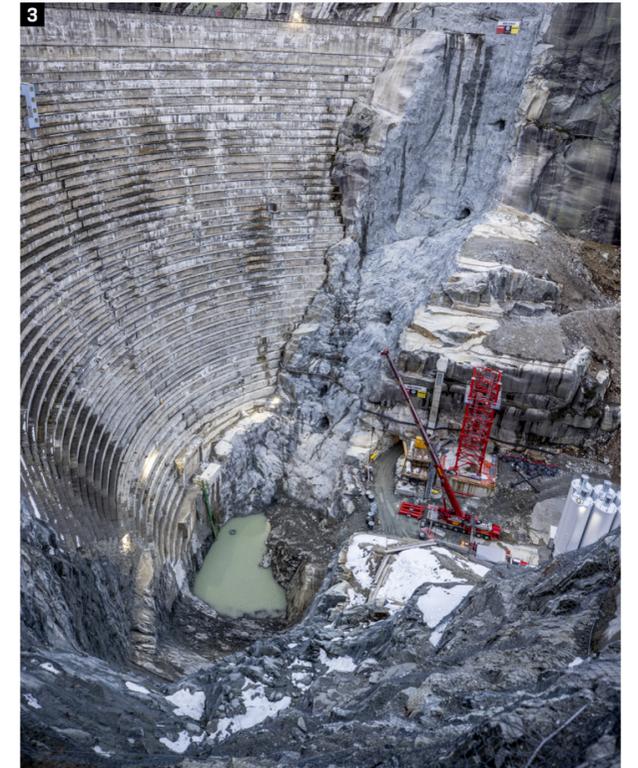

1 1
 Etwas Derartiges zu bauen, ist äusserst anspruchsvoll. Aber hier an der Grimsel kommen noch die Höhe und das schnell wechselnde Wetter mit Regen, Schnee – auch im Sommer – und Föhn an über 120 Tagen im Jahr dazu. Die Leute, die hier oben arbeiten, haben in diesen ersten beiden Bausaisons einen sehr harten, aber auch sehr guten Job gemacht

Ralf Grand, Chefbauleiter KWO

1 Auch Anfang Juni kann es an der Grimsel schneien. 2 Leiter Projekte KWO, Benno Schwiegler 3 Blick auf den fertigen Aushub und die Montage des Kranturms. 4 Chefbauleiter KWO, Ralf Grand. 5 Die Sprengzünder werden in kleinen, sicheren Betonbunkern gelagert. Fotos: David Birri
